

**AGENCIJA ZA VODNE
PUTOVE**

**VUKOVAR, Parobrodarska 5
Tel: 032-450-613, fax: 032-450-653**

RA-17-02/03

**POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA 2016. GODINU**

Vukovar, 2017.

UVOD

Agencija za vodne putove (u daljnjem tekstu: Agencija) je javna ustanova, osnivač koje je Republika Hrvatska, a osnovana je Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN-109/2007; 132/2007, 51A/2013 i 152/2014).

Osnovna zadaća i svrha djelovanja Agencije je upravljanje vodnim putovima Republike Hrvatske obavljanjem javne službe na temelju javnih ovlasti kojima se ostvaruje sigurnost plovidbe.

Javna služba obuhvaća poslove gradnje, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije vodnih putova, tehničkog održavanja vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda.

Temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, Agencija obavlja poslove koji obuhvaćaju:

- izradu prijedloga Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda u dijelu koji se odnosi na vodne putove
- gradnju, tehničko unapređenje i prometno- tehnološku modernizaciju vodnih putova
- tehničko održavanje vodnih putova,
- osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda,
- osiguravanje funkcionalnosti Riječnih informacijskih servisa,
- kontrolu i nadzor stanja plovnog puta.

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti Agencije osiguravaju se u državnom proračunu i iz drugih izvora.

Pravni okvir poslovanja Agencije uređen je:

- Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine, br.109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014)
- Uredbom o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (Narodne novine, br: 58/2008).
- Statutom
- Ostalim općim aktima

Upravno vijeće Agencije je na svojoj dvadesetprvoj (XXI/III Sjednici u trećem sazivu održanoj 07. srpnja 2016. godine, donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg plana rada Agencije za vodne putove za 2016. godinu te Financijskog plana Agencije za vodne putove za 2016.godinu, s projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Na istoj sjednici usvojen je i Prijedlog godišnjeg programa rada, građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2016.god.

U okviru općeg cilja, Održivi razvoj prometnog sustava, iz Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2016. – 2018. godine, Agencija je svojim Godišnjim planom za 2016. bila usmjerena na jedan provedbeni i jedan opći specifični cilj prema tablici 1.

Tablica 1.

RB	SPECIFIČNI CILJEVI	ZADATAK/ AKTIVNOST
	<i>Što želimo postići?</i>	<i>Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?</i>
A	B	C
1.	Mjerama građenja i tehničkog održavanja vodnih putova osigurati sigurnu plovidbu u definiranim parametrima	Batimetrijsko snimanje i praćenje stanja plovnosti Održavanje vodnih putova Obilježavanje unutarnjih vodnih putova Održavanje do sada izvedenog servisa CRORIS poboljšanje uvjeta plovidbe i osnovnim bagerovanjem
2.	Surađivati s tijelima nadležnim za upravljanje vodnim putovima drugih država	Sastanci u cilju praćenja i provedbe međudržavnih ugovora o plovidbi i održavanju vodnih putova Sudjelovanje u radu međunarodnih tijela vezanim za europsku mrežu vodnih putova

Za ostvarenje prvog cilja donesen je Godišnji program rada, građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2016. godinu koji je, pored planiranih stavki za redovan rad Agencije, sadržavao planove prema tablici 2.

Tablica 2 – Pregled programa „Građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2016. godinu“

Program 3115		RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA-31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
1.	Godišnji program tehničkog održavanja vodnih putova	
	1.1.	Program snimanja vodnih putova i izrade tehničke dokumentacije održavanja
	1.2.	Program radova održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe i redovnog održavanja akvatorija na lučkim područjima -Godišnji program održavanja
	1.3.	Program obilježavanja vodnih putova
	1.4.	Program održavanja objekata i opreme koji služe za riječne informacijske sustave (RIS)

2.	Godišnji program građenja i uređenja vodnih putova	
	2.1..	Izrada podloga projekata i studija
	2.2..	Izgradnja vodnih putova i uređenje objekata sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe
	2.3.	Izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava
3.	Tekuće i kapitalne pomoći	
4. Program 3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	
	1.	OP Promet
	2.	FAIRway Hrvatska
	3.	RIS COMEX

Ovo izvješće sadrži :

- A. Izvješće o izvršenju plana rada administracije i upravljanja Agencije za vodne putove za 2016. godinu
- B. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada, građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2016. godinu
- C. Izvješće o suradnji s tijelima nadležnim za upravljanje vodnim putovima drugih država

A. IZVRŠENJE PLANA RADA ADMINISTRACIJE I UPRAVLJANJA AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE ZA 2016. GODINU


A.1. Izvršenje plana rada administracije i upravljanja Agencije za vodne putove

Agencija ima tri sektora i ukupno zaposlenih 27 djelatnika:

-Ured ravnatelja (zajedničke službe);4 djelatnika

-Sektor razvoja i pripreme; 6 djelatnika od toga su dva djelatnika na poslovima hidrografskih snimanja vodnih putova

-Sektor operative:17 djelatnika, 14 djelatnika kao posada brodova za obilježavanje vodnih putova u Vukovaru- 6 članova posade, Sisak – tri člana posade, Slavonski Brod- tri člana posade i Osijek-dva člana posade

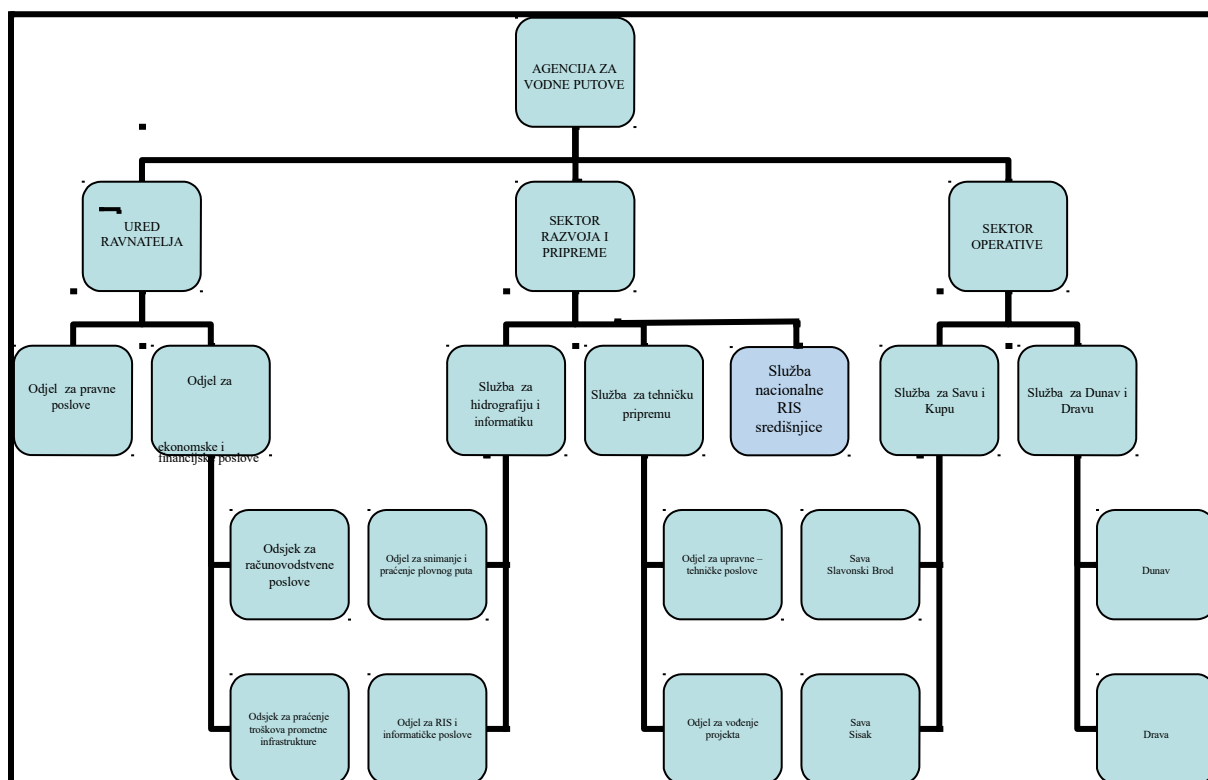

Agencija je za obavljanje djelatnosti obilježavanja vodnih putova na korištenje dobila 4 plovila: jedno plovilo na vodnom putu rijeke Dunav, dva plovila na vodnom putu rijeke Save i jedno plovilo na vodnom putu rijeke Drave. Agencija je tijekom 2016.-te godine za poslovima obilježavanja vodnog puta rijeke Save, Kupe i Une preuzela novo izgrađeno plovilo „Una“ čija je izgradnja financirana iz državnog proračuna. Za smještaj plovila Agencija raspolaže s tri pristana: u Vukovaru, Osijeku i Davoru.

Za potrebe snimanja i praćenja plovnih putova te za potrebe obilježavanja vodnih putova Agencija ima jedan čamac-gliser i dva manja čamca s vanbrodskom motorom, kao i pomoćne čamce koji su sastavni dio opreme plovila za obilježavanje. Ekipe za obilježavanje su opremljene sitnom mehanizacijom za održavanje oznaka (8 trimera, 4 motorne pile, 2 bušača rupa, 4 pumpe za vodu kao i ostali ručni alatni strojevi)

Za redovno poslovanje Agencija raspolaže s 4 putnička i dva teretna vozila:

- Škoda Superb (2012. god.) –za potrebe Ureda ravnatelja
- Škoda Octavia (2014.god.)- za potrebe Sektora razvoja i pripreme i Službe za Dravu i Dunav
- Mitsubishi ASX(2012.god.)- za potrebe Sektora operative
- Citroen C-5 (2005. god.)- za potrebe Službe nacionalne RIS središnjice
- Toyota Hilux (2008. god.)- za potrebe Odjela za snimanje i praćenje plovnog puta Dunava i Drave i
- Toyota Hilux (2008. god.)- za potrebe Odjela za obilježavanje plovnog puta rijeke Save, Kupe i Une

Financijska sredstva za administraciju i upravljanje Agencije realizirane su kroz tri aktivnosti/projekta na pozicijama državnog proračuna:

A570448 – Administracija i upravljanje Agencije za vodne putove

Sredstvima ove aktivnosti osigurane su redovite isplate plaća djelatnika Agencije, provođena su stručna usavršavanja djelatnika (polaganja stručnih ispita za zvanja u plovidbi), plaćene su usluge osiguranja i redovita opskrba gorivom plovila Agencije te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kako poslovnih prostora tako i usluge održavanja plovila koji m je omogućeno pravovremeno i učinkovito obavljanje redovne djelatnosti. Od planiranih 6.331.500,00 kn realizirano je 5.758.729,94 kn ili 90,95%, a utrošak po pojedinim stavkama je iskazan u tablici 3.

K 8100023 Obnova voznog parka

Agencija putem operativnog leasinga koristi tri vozila (Škoda Superb, Škoda Octavia i Mitsubishi ASX). Za usluge najma, tekućeg održavanja i osiguranja u 2016. godini od planiranih 130.000,00 kn realizirano je 115.586,32 kn ili 88,91%.

K8100024 Izgradnja plovila i plovnih objekata u riječnoj plovidbi

Projektom su planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kn, a realizirano je 185.704,63 kn ili 92,85%. Sredstva se odnose na troškove izgradnje plovila u unutarnjoj plovidbi, odnosno, opremanje pristana sa službena plovila u Davoru i Osijeku te za nabavku čamca s vanbrodskim motorom za potrebe obilježavanja vodnog puta rijeke Save i Kupe na području grada Siska.

Tablica 3

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE					
Oznaka	Opis	Plan 2016.	Rebalans i prerasp. prosinac 2016.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A570448	Adm inistracija i upravljanje Agencije za vodne putove				
3111	plaće za redovan rad	2.750.000	2.620.000	2.592.276,71	98,94%
3114	plaće za posebne uvjete rada	5.000	5.000	0,00	0,00%
3121	ostali rashodi za zaposlene	50.000	124.000	121.991,92	98,38%
3132	doprinosi za zdravstveno osiguranje	420.000	420.000	400.750,39	95,42%
3133	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48.000	48.000	44.068,87	91,81%
3211	službena putovanja	150.000	150.000	139.464,72	92,98%
3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	425.000	425.000	412.772,34	97,12%
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	60.000	60.000	40.590,00	67,65%
3214	ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.018,00	20,36%
3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000	50.000	45.272,21	90,54%
3222	materijal i sirovine	5.000	5.000	0,00	0,00%
3223	energija	650.000	520.000	426.981,85	82,11%
3224	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.000	85.000	64.346,81	75,70%
3225	sitni inventar i auto gume	50.000	50.000	37.763,72	75,53%
3227	Službena i radna odjeća	30.000	30.000	29.234,72	97,45%
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000	110.000	60.203,56	54,73%
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000	496.000	404.888,62	81,63%
3233	usluge promidžbe i informiranja	50.000	40.000	39.025,50	97,56%
3234	komunalne usluge	15.000	15.000	12.585,79	83,91%
3235	zakupnine i najamnine	85.000	85.000	96.607,24	113,66%
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	10.000	1.272,00	12,72%
3237	intelektualne i osobne usluge	60.000	60.000	29.861,87	49,77%
3238	računalne usluge	50.000	50.000	24.555,00	49,11%
3239	ostale usluge	102.000	102.000	112.747,71	110,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	6.266,07	34,81%
3291	naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340.000	375.000	374.216,05	99,79%
3292	premije osiguranja	80.000	80.000	79.361,76	99,20%
3293	reprezentacija	50.000	50.000	30.111,52	60,22%
3294	Članarine i norme	2.000	20.000	19.997,63	99,99%
3295	Pristojbe i naknade	10.000	10.000	15.388,54	153,89%
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000	5.000	0,00	0,00%
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	22.500	23.083,46	102,59%
3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	1.000	0,00	0,00%
3433	zatezne kamate	1.000	1.000	23,99	2,40%
3434	ostali nespomenuti f inancijski rashodi	4.000	4.000	12,91	0,32%
3835	ostale kazne	10.000	10.000	0,00	0,00%
3861	kapitalne pomoći kreditnim i ostalim f inancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	0	0,00	0,00%
4123	Licence	20.000	0	0,00	0,00%
4221	uredska oprema i namještaj	40.000	40.000	0,00	0,00%
4222	komunikacijska oprema	20.000	20.000	30.661,46	153,31%
4223	oprema za održavanje i zaštitu	20.000	20.000	4.112,50	20,56%
4225	instrumenti, uređaji i strojevi	40.000	40.000	13.432,50	33,58%
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	50.000	23.782,00	47,56%
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000	0	0,00	0,00%
	Ukupno:	6.586.000	6.331.500	5.758.729,94	90,95%

Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika

Tijekom 2016.godine djelatnici Agencije su sudjelovali na više seminara i edukacija iz područja javne nabave i financija, građenja i pripreme projekta EU, a 5 djelatnika pohađalo je obuku radi mogućnosti polaganja za stručna zvanja u brodarstvu.

Ostale aktivnosti od značaja za vodne putove i ustroj Agencije.

Agencija je u svojstvu javnopravnog tijela za upravljanje vodnim putovima, temeljem zakonske obveze dala niz suglasnosti za obavljanje građevinskih radova na vodotocima koji imaju utjecaja na vodne putove. Također je, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji kao i Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, izdala niz dokumenata za gradnju objekata koji mogu imati utjecaja na plovne putove od kojih je znatan dio u upravnom postupku:

- mišljenja
- posebni uvjeti za izradu tehničke dokumentacije
- potvrde glavnog projekta
- potvrde za legalizaciju objekata (posebno na koridoru budućeg VKDS)
- rješenja o odbijanju zahtjeva
- prijedloga na izrade prostornih planova
- suglasnosti na prostorne planove

B. IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA, GRAĐENJA, TEHNIČKOG UNAPREĐENJA I PROMETNO TEHNOLOŠKE MODERNIZACIJE, TE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA VODNIH PUTOVA I OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE

1. Tehničko održavanje vodnih putova

1.1. Program snimanja i praćenja stanja plovnosti vodnih putova te izrade tehničke dokumentacije održavanja

Služba za hidrografiju i informatiku ima dva stalna djelatnika na poslovima snimanja vodnih putova, a po potrebi u rad se uključuje i drugo tehničko osoblje Agencije. U 2016.god. su nastavljene aktivnosti osposobljavanja djelatnika za batimetrijsko snimanje vodnih putova.

Uspješno su obavljena snimanja:

dionice Dunava od rkm 1295 do rkm 1433 (od Iloka do Batine) redovno snimanje vodnog puta po evidencijskim profilima te na kritičnim dionicama prema odredbama Sporazuma o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju sklopljenim između Republike Hrvatske i Republike Srbije, dionice ušća Drave u Dunav radi stvaranja baze podataka o morfološkim promjenama poradi buduće studije pronosa nanosa na ovoj lokaciji. U 2016. god. obavljeno je 10 snimanja.

kritične dionice Save: Slavonski Šamac, Migalovci, Višnjica, Drenov Bok, Puska, Lonja, Strmen, Bobovac, Gušće i Blinjski Kut.

kritične dionice Drave od ušća do rkm 19,0 za praćenje stanja plovnosti, u svrhu pripreme za koncesije i izradu elaborata tehničkog održavanja te snimanja na kojima je obavljano tehničko održavanje kinete plovnog puta prije i poslije iskopa na mjestu iskopa i mjestu odlaganja materijala.

Služba za hidrografiju i informatiku je u 2016. godini obavila ukupno 423,4 r i j e č n i h kilometara redovnih snimanja vodnih putova. Od toga: na Dunavu 351,0 rkm, na Dravi 39,8 rkm i na Savi 32,3 rkm. Ukupno je snimljeno 3289 poprečnih profila od čega: na Dunavu 1834 profila, na Dravi 784 profila i na Savi 671 profila.

Oprema i plovilo za snimanje vodnog puta korišteno je 61 dan aktivno na terenu. Za dodatna snimanja na kritičnim lokacijama i za potrebe izrade elaborata tehničkog održavanja oprema i plovilo korišteni su 25 dana aktivno na terenu.

Većinu dokumentacije za potrebe tehničkog održavanja u obliku elaborata izrađivala je Agencija na osnovu batimetrijskih snimanja.

Dok su se za izradu studija utjecaja na ekološku mrežu i geodetska snimanja morfoloških promjena u prokopu Drave kod Nemetina koristile usluge vanjskih izrađivača.

U sklopu ovog programa utrošena su financijska sredstva u iznosu od 210.280,50 kuna.

Pregled izvršenja u odnosu na plan, rebalans i preraspodjele dan je u tablici 4.

Tablica 4

PROGRAM SNIMANJA VODNIH PUTOVA I IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ODRŽAVANJA za 2016. godinu					
Oznaka	Opis	Plan 2016.	izmjene i dopune plana pros inac 2016.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda				
4511	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA I STUDIJE ODRŽAVANJA				
	Na Dunavu	160.000,00	40.000,00	19.530,80	48,83%
	Na Dravi	360.000,00	200.000,00	190.750,00	95,38%
	Na Savi	180.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Na Kupi i Uni	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Ukupno:	700.000,00	300.000,00	210.280,80	70,09%

1.2. Program radova održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti za poboljšanje uvjeta plovidbe i redovnog održavanja akvatorija na lučkim područjima -Godišnji program održavanja

Sva sredstva namijenjena radovima tehničkog održavanja utrošena su za radove na rijeci Dravi. Obavljeno je tehničko čišćenje dionice od rkm 10,0 do rkm12,0 te radovi sanacije i popravaka osiguranja na desnoj obali prokopa između rkm 12,2 i rkm 14,0. U okviru ovih radova izvedeno je osiguranje oštećene obale na rkm 13,00 te završeni radovi naprokopu gdje je bilo prisutno intenzivno urušavanje pjeskovite obale kao i mjestimična popuna urušenih dijelova obaloutvrde i spoj s pregradom „G“. Na dionici od rkm 10,0 do rkm12,0 uklonjeno je 22.303 m³ pijeska iz plovnog puta koji je odložen u vodotok, nizvodno uz desnu obalu, izvan plovnog puta.

Na Dunavu su izvedeni radovi osiguranja obale s izvedbom temelja za instaliranje novih vodomjernih postaja za potrebe programa „Dunav FAIRway Hrvatska“ na lokacijama Kazuk (Siga) ,rkm 1412,2, Petreš, rkm 1393,0, Sotin rkm 1322,0 i Mohovo, rkm 1311,0.

Za radove tehničkog održavanja vodnih putova utrošeno je od planiranih 2.782.500,00 kn ukupno 2.337.652,81 kn ili 84,01 %. Niži postotak realizacije od planiranog je nemogućnost obavljanja radova uklanjanja nanosa prije 15.kolovoza na Dravi i prije 01. rujna na Savi, sukladno uvjetima iz Rješenja.

Pregled izvršenja u odnosu na plan, rebalans i preraspodjele dan je u tablici 5.

Tablica 5.

PROGRAM RADOVA ODRŽAVANJA VODNIH PUTOVA I OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE ZA POBOLJŠANJE UVJETA PLOVIDBE I REDOVNOG ODRŽAVANJA AKVATORIJA NA LUČKIM PODRUČJIMA za 2016. godinu					
Oznaka	Opis	Plan 2016.	izmjene i dopune plana pros inac 2016.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarjih voda				
3232	ODRŽAVANJE VODNIH PUTOVA				
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodnih putova				
	na Dunavu	720.000,00	220.000,00	212.855,56	96,75%
	na Dravi	620.000,00	2.527.500,00	2.124.797,25	84,07%
	na Savi	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00%
	na Kupi i Uni	140.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Ukupno	2.600.000,00	2.747.500,00	2.337.652,81	85,08%

1.3. Program obilježavanja vodnih putova

Obilježavanje vodnih putova se obavlja na sljedećim vodnim putovima:

1. Na rijeci Dunav od rkm 1295,5 do rkm 1433,1
2. Na rijeci Dravi od rkm 0,00 do rkm 198,6
3. Na rijeci Savi od rkm 210,8 do rkm 594,0
4. Na rijeci Kupi od rkm 0,00 do rkm 140,0
5. Na rijeci Uni od rkm 0,00 do rkm 15,0

Na граниčnim vodnim putovima poslovi obilježavanja vodnih putova usklađeni su i podijeljeni prema međudržavnim ugovorima :

Na Dunavu:

- desnu stranu obilježava Republika Hrvatska
- lijevu stranu obilježava Republika Srbija

Na Dravi:

- od rkm 0,0 do rkm 125,6 obilježavanje provodi Republika Hrvatska na obje strane vodnog puta;
- od rkm 125,6 do rkm 198,6 obilježavanje provodi Mađarska na obje strane v o d n o g puta.

Na Savi:

- od rkm 210,8 do rkm 343 obilježavanje provodi Bosna i Hercegovina na obje strane vodnog puta.

– od rkm 343,0 do rkm 594 obilježavanje provodi Republika Hrvatska na obje strane vodnog puta.

Na Uni:

– od rkm 0,0 do rkm 5,0 obilježava Republika Hrvatska i ovdje su postavljene obalne kilometarske oznake.

Poslove obilježavanja vodnih putova obavlja Agencija pomoću plovila:

- Brod „Vučedolska golubica“ na Dunavu
- Motorni čamac RH 285 OK na Dravi
- Motorni čamac RH 36 SB na Savi na području nadležnosti Lučke kapetanije Slavonski Brod
- Motorni čamac „Una“ na Savi, Kupi i Uni na području nadležnosti Lučke kapetanije Sisak

Na poslovima obilježavanja do studenog 2016. godine ukupno je bilo uposleno 15 djelatnika.. Nakon odlaska jednog djelatnika u mirovinu i zabrane zapošljavanja, ekipa na obilježavanju vodnog puta rijeke Drave nije kompletna, a problem nije moguće riješiti preraspodjelom djelatnika jer je radno mjesto uvjetovano zvanjem iz unutarnje plovidbe. U svrhu rješavanja navedene problematike Agencija planira zatražiti zapošljavanje novog djelatnika koji ima potrebno zvanje u unutarnjoj plovidbi.

Radovi obilježavanja vodnih putova obavljali su se uredno i pravovremeno. Nije bilo nikakvih nedostataka čime bi bila ugrožena sigurnost plovidbe. Usluge popravaka oštećenih oznaka i usluge korištenja čamca za obilježavanje u slučaju kvara plovila Agencije ugovorene su sa tvrtkama Vodogradnja Osijek d.d. iz Osijeka za područje obilježavanja za Dunav i Dravu, a za Savu sa tvrtkom Brodska Posavina d.d. iz Slavenskog Broda.

Planovi obilježavanja na međudržavnim dionicama usklađeni su s planovima Republike Srbije na vodnom putu Dunava i Mađarske na vodnom putu Drave. Planovi obilježavanja se usuglašavaju s nadležnim Lučkim kapetanijama prilikom donošenja i izmjena koje se događaju na vodnim putovima tijekom godine.

Obavljanje radova obilježavanja nadzirale su nadležne Lučke kapetanije, putem inspekcije sigurnosti plovidbe.

Na Kupi od Siska do Karlovca redovito su se održavale lokacije kilometarskih oznaka košnjom trave i drvenastog raslinja oko istih.

Izvršenje programa obilježavanja unutarnjih vodnih putova prikazano je u tablici 6.

Tablica 6.

PROGRAM RADOVA OBILJEŽAVANJA I KONTROLE STANJA VODNIH PUTOVA za 2016. godinu					
Oznaka	Opis	Plan 2016.	izmjene i dopune plana pros inac 2016.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda				
3232	ODRŽAVANJE VODNIH PUTOVA				
	Usluge održavanja sustava obilježavanja, znavljanje dotrajalih oznaka, dopuna sustava i radioničke usluge i sl.				
	na Dunavu i Dravi	500.000,00	350.000,00	216.996,00	62,00%
	na Savi, Kupi i Uni	500.000,00	400.000,00	329.450,00	82,36%
	Ukupno	1.000.000,00	750.000,00	546.446,00	72,86%

1.4. Program održavanja objekata i opreme koji služe za riječne informacijske sustave (RIS)

Usluge održavanja i razvoja informacijskog i komunikacijskog sustava za program RIS-a su planirane kroz Godišnji program rada građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2016.godinu, te realizirane putem tvrtke RGO komunikacije d.o.o. iz Zagreba.

Obavljene su usluge održavanja postojeće informatičke i komunikacijske opreme i programa, te usluge razvoja i modernizacije postojećeg sustava RIS na Dravi i Dunavu.

Na vodnom putu Save je završena implementacija sustava Sava RIS putem Programa OP Promet, te je izvršena integracija sustava s postojećim sustavom na Dravi i Dunavu u jedinstveni sustav HR RIS.

Realizacija radova održavanja objekata, uređaja i opreme koji služi za riječne informacijske servise (RIS) prikazana je u tablici 7.

Tablica 7.

PROGRAM RADOVA ODRŽAVANJA SUSTAVA RIS-a za 2016. godinu					
Oznaka	Opis	Plan 2016.	izmjene i dopune plana pros inac 2016.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda				
A.	rashodi za usluge, Održavanje sustava RIS-a	1.450.000,00	1.282.500,00	1.087.668,2	84,81%
I.	Održavanje uređaja i opreme sustava RIS-a	850.000,00	682.500,00	682.500,0	100,00%
A.I.1.	<i>Funkcionalno održavanje sustava HR- RIS-a</i>	500.000,00	435.000,00	435.000,0	100,00%
A.I.2.	<i>Održavanje opreme sustava RIS-a</i>	150.000,00	0,00	0,00	-
A.I.3.	<i>Uspostava jedinstvenog nacionalnog AIS sustava HR RIS</i>	200.000,00	247.500,00	247.500,0	100,00%
A.II.	Usluge interneta (3231)	100.000,00	100.000,00	105.747,4	105,75%
A.III.	Zakup i najam lokacija (3235)	500.000,00	500.000,00	299.420,8	59,88%
B.	Iz proračunske stavke 4123 Licence	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
C.	Iz Proračunske stavke 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
	SVEUKUPNO I.D. (A.+B+C) :	1.605.000,00	1.357.500,00	1.087.668,2	80,12%

2. Građenje i uređenje vodnih putova

2.1. Izrada potrebne dokumentacije odnosno izrada podloga, projekata i studija potrebnih za izvođenje radova.

Izrada dokumentacije i podloga za potrebe građenja financirana je iz državnog proračuna putem stavke 4126 – Program izrade projekata i studija - Ostala nematerijalna imovina.

Izvršenje programa je prikazano u tablici 8.

Tablica 8.

PROGRAM IZRADE PROJEKTA I STUDIJA za 2016. godinu					
Oznaka	Opis	Plan 2016.	izmjene i dopune plana pros inac 2016.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda				
4126	Program izrade projekata, studija				

	Na Dunavu	360.000,00	300.000,00	282.812,50	94,27%
	Na Dravi	650.125,00	500.000,00	460.562,50	92,11%
	Na Savi	189.875,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Na Kupi i Uni	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Ukupno:	1.350.000,00	900.000,00	743.375,00	82,60%

Na Dunavu su aktivnosti bile koncentrirane na lokaciju zimovnika Opatovac. Izrađena je novelacija glavnog projekta, u skladu s inspekcijskim rješenjem za uklanjanje pregrade uzvodno zimovnika (koja je izgrađena još u vrijeme Austro- Ugarske), obavljeno je geodetsko snimanje rukavca i izrađena analiza pronosa nanosa kroz rukavac.

Na Dravi je izrađen elaborat praćenja morfoloških promjena u prokopu Nemetin, dovršeno je konceptijsko rješenje uređenja vodnog puta Drave od ušća u Dunav do luke Nemetin (rkm 0,0 do rkm 12,0) te izrađeno projektno rješenje sanacije oštećenja u prokopu Nemetin, obzirom da je osiguranje bilo projektirano s minimalnim opsegom građenja umjetnih građevina.

2.2. Radovi izgradnje vodnih putova i uređenja objekata sigurnosti plovidbe radi poboljšanja stanja plovnosti na postojećim vodnim putovima,

U 2016. godini prema Godišnjem programu radova nisu bili planirani niti su izvršeni ikakvi radovi iz ovog programa.

2.3. Izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava

Za Višenamjenski kanal Dunav – Sava, pored ugovornih obveza za monitoringom šumskih zajednica i poljoprivrednih tala, planom je bila predviđena i izrada Studije opravdanosti izgradnje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, prema metodologiji važećoj za financiranje projekta iz EU fondova sve u skladu s Studijom regionalnog prometnog razvitka Republike Hrvatske.

Usluge izrade monitoringa šumskih zajednica nisu ugovorene u 2016. godini jer se na javno nadmetanje nije javila niti jedna tvrtka koja je zadovoljavala uvjete iz dokumentacije za nadmetanje.

Tijekom srpnja 2016. godine izrađena je dokumentacija za nadmetanje za usluge izrade Studije opravdanosti za višenamjenski kanala Dunav –Sava i objavljen je poziv na nadmetanje, ali postupak odabira izrađivača Studije nije okončan do kraja godine.

Prikaz realizacije dan je u tablici 9.

Tablica 9.

Oznaka	Opis	Plan 2016.	izmjene i dopune plana prosinac 2016.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV - SAVA				
4126	Ostala nematerijalna imovina				
C.	IZRADA PODLOGA, PROJEKATA I STUDIJA				
C.1.	Priprema radovi za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava, studije i projekti, monitoring šumskih zajednica i poljoprivrednih tala, stručne podloge, geodetske podloge i razminiranja	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
C.2.	Izrada Studije opravdanosti izgradnje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, izrada prema metodologiji važećoj za financiranje projekta iz EU fondova. Studija se radi na temelju Studije regionalnog prom etnog razvitka.	3.600.000,00	1.000.000,00	22.500,00	2,25%
	UKUPNO II.C. - PODLOGE, PROJEKTI I STUDIJE za VKDS iz 4126:	5.000.000,00	1.000.000,00	22.500,00	2,25%

Slijedom navedenog, u okviru ovog programa realizirana je samo izrada dokumentacije za nadmetanje za izradu Studije koja je izrađena od vanjskih suradnika u vrijednosti od 22.500 kuna.

3. Program tekuće i kapitalne pomoći

U okviru financijskog plana planirano je sufinanciranje projekta „Zagreb na Savi“ za što je i potpisan sporazum, ali radi neodređenosti projekta isti nije realiziran u 2016 godini.

Rekapitulacija izvršenje Godišnjeg programa rada, građenja i tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe

Rekapitulacije ja dana u tablici 10, prema pojedinim programa iz Godišnjeg plana Agencije, kao i zbirna rekapitulacija prema aktivnostima iz državnog proračuna, u tablici 11, obzirom da se program financira iz aktivnosti K810001- Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda i K810006 - Izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava.

Tablica 10 – Rekapitulacija po programima građenja i tehničkog održavanja

Ozn.	Pozicija prorač.	Opis	Plan 2016.	izmjene i dopune pros inac 2016.	Ostvareno	%-tak ostvarenj a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda				
1.		Tehničko održavanje vodnih putova	5.905.000,00	5.155.000,00	4.182.047,60	81,13%
1.1.	4511	Snimanje vodnih putova i izrada tehničke dokumentacije održavanja	700.000,00	300.000,00	210.280,50	70,09%
1.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodnih putova	2.600.000,00	2.747.500,00	2.337.652,81	85,08%
1.3.	3232	Usluge održavanja sustava obilježavanja, znavljanje dotrajalih oznaka, dopuna sustava i radioničke usluge i sl.	1.000.000,00	750.000,00	546.446,00	72,86%
1.4.		Održavanje sustava RIS-a	1.605.000,00	1.357.500,00	1.087.668,29	80,12%
	3232	<i>opreme sustava HR- RIS-a</i>	<i>850.000,00</i>	<i>682.500,00</i>	<i>682.500,00</i>	<i>100,00%</i>
	3231	<i>Usluge interneta</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>105.747,44</i>	<i>105,75%</i>
	3235	<i>Zakup i najam lokacija</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>299.420,85</i>	<i>59,88%</i>
	4123	<i>Licence</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4541	<i>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</i>	<i>125.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.		Građenje i uređenje vodnih putova	6.350.000,00	1.900.000,00	765.875,00	40,31%
2.1.	4126	Izrada podloga, projekta i studija	1.350.000,00	900.000,00	743.375,00	82,60%
2.2.	4214	radovi izgradnje vodnih putova i uređenja objekata sigurnosti plovidbe radi poboljšanja stanja plovnosti na postojećim vodnim putovima,	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	K810006	Izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava	5.000.000,00	1.000.000,00	22.500,00	2,25%
3.		Tekuće i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3.	3631	tekuće pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	3632	kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		SVEUKUPNO:	12.265.000,00	7.065.000,00	4.947.922,60	70,03%

Tablica 11 – Rekapitulacija po aktivnostima proračuna

Aktivnos t proračuna.	Opis	Plan 2016.	izmjene i dopune proračuna pros inac 2016.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1	2.	3.	4.	5.	6.
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda	7.265.000,00	6.065.000,00	4.925.422,60	81,21%
K810006	Izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava	5.000.000,00	1.000.000,00	22.500,00	2,25%
	SVEUKUPNO:	12.265.000,00	7.065.000,00	4.947.922,60	70,03%

4. Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

4.1. K810052 CEF 2014.-2020.-FAIRway HRVATSKA

Kroz program CEF 2014.-2020. Agencija je 01. srpnja 2015. započela s realizacijom projekta FAIRway (Coordinated Deployment of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan). Projekt predstavlja razradu koordiniranih nacionalnih ulaganja i operativnih planova rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka, odnosno, prvu fazu implementacije Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njezinih plovnih pritoka, a koji je dio Radnog plana TEN-T koridora Rajna-Dunav.

Specifični ciljevi projekta su:

- Podizanje kvaliteta hidroloških usluga namijenjenih korisnicima vodnog puta
- Podizanje učinkovitosti rehabilitacijskih i mjera održavanja vodnog puta rijeke Dunav
- Osiguranje plovnosti rijeke Dunav tijekom cijele godine
- Podizanje razine sigurnosti plovidbe

Aktivnosti projekta uključuju mjere detaljnog snimanja plovnog puta i napredne analize te modeliranje kroz tri razdoblja niskog vodostaja. Navedene mjere zahtijevaju nabavu najsuvremenije opreme za snimanje i obradu podataka (višesnopni dubinomjer i softver za obradu podataka) te zajedničke standarde koji će biti razvijeni kroz projekt. Kroz projekt također će biti razvijen i transnacionalni IT sistem čija baza podataka će biti od velike koristi za ostale projekte na koridoru. Osim navedenog putem projekta biti će nabavljen multifunkcionalno plovilo za obilježavanje plovnog puta te nabavljene i postavljene 4 dodatne vodomjerne stanice, modernizirano 5 postojećih vodomjernih stanica na rijeci Dunav. Izrada modela 3-5 dnevne prognoze vodostaja za rijeku Dunav.

Ukupna vrijednost projekta je:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Sredstva Republike Hrvatske | 1.901.000 kn – 15,00 % |
| - Sredstva EU fondova): | 10.719.600 kn – 85,00 % |

Ukupno zajedničko financiranje:	12.620.600 kn–100,00
%	
- Sredstva Republike Hrvatske za nepredviđene troškove	30.000 kn

- Sveukupno: 12.650.600 kn

U 2016. godini od planiranih 2.472.100,00 kuna, realizirano je 990.393,30 kuna ili 40,06

%. Nabavljena je oprema za instaliranje četiri nove vodomjerne postaje na Dunavu te oprema za obnovu pet postojećih vodomjernih postaja, a građevinski radovi osiguranja obala na lokacijama postaja su izvedeni u okviru radova tehničkog održavanja. Također je ugovorena izrada plovila za snimanje plovnog puta, za koji je završetak planiran 2017. godine. Za nabavu multifunkcionalnog plovila za obilježavanje vodnog puta proveden je postupak javne nabave na koji nije pristigla niti jedna ponuda te je isti poništen. Stoga je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi proveden pregovarački postupak. Poziv na dostavu ponuda poslan je na 6 adresa. Do roka za predaju pristigle su dvije ponude koje su nakon postupka pregleda i ocjene ponuda ocijenjene kao nevaljale ponude te je postupak poništen u prosincu 2016.

4.2. K810053 CEF 2014.-2020.-RIS COMEX

2016. godine Agencija je započela s provedbom ovog projekta. Projekt predstavlja uspostava i razvoj usluga kroz riječne informacijske servise koji će biti temeljeni na podršci unutarnjoj plovidbi, ne samo lokalno već i na razini cijele mreže unutarnjih vodnih putova, odnosno, pojedinih koridora na mreži. Uspostava „upravljanja koridorom“ u obliku informacijskih servisa korištenih, kako između ustanova zaduženih za vodne putove međusobno, tako i od samih korisnika vodnih putova, odnosno, logističkih partnera u cilju optimizacije upotrebe koridora vodnih putova unutar mreže Europskih vodnih putova.

Takve usluge su preduvjet za upravljanje prometom na vodnim putovima između gospodarskih zona u neposrednoj blizini rječnih tokova.

Postoje tri razine predefiniranih usluga koje su opisane u sljedećoj tablici:

razina	usluge	Informacije o
1	Omogućavanje pouzdanog planiranja rute temeljenog na informacijama o infrastrukturi	Statičke informacije o infrastrukturi, dinamičke informacije o infrastrukturi
2.a	Omogućavanje pouzdane informacije o trajanju putovanja (za planiranje putovanja i upravljanje prometom) temeljeno na stvarnim prometnim podacima	Plovilima, prometu, putovanjima
2.b	Isto kao 2.a temeljeno i na planiranim prognozama prometa	Planiranim prognozama
3	podržavanje upravljanjem prometom (dostupno samo na temelju kontrole pristupa temeljene na ulogama)	Praćenju plovila/tereta, prognoza odstupanja

Temeljeno na prijašnjoj suradnji partneri projekta RIS COMEX su odlučni u zajedničkom uspostavljanju usluga na koridorima. Partnerstvo uključuje povezanu TEN-T osnovnu mrežu vodnih putova, od Francuske preko Belgije i Luksemburga do Nizozemske i preko Njemačke Dunavom (s Austrijom, Slovačkom, Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Rumunjskom i Srbijom) te Češkom.

Ukupna vrijednost projekta

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Sredstva Republike Hrvatske | 350.500 kn – 15,00 % |
| - Sredstva EU fondova): | 1.969.500 kn – 85,00 % |
-

Ukupno zajedničko financiranje: 2.320.000 kn –100,00 %
Sredstva Republike Hrvatske za nepredviđene troškove 60.000 kn

Sveukupno: 2.380.000 kn

U 2016. godini od planiranih 31.500,00 kuna realizirano je 4.221,00 kuna ili 13,40%, što se odnosi na službena putovanja djelatnika za potrebe projekta.

4.3. T810051 OP PROMET

Agencija je tijekom 2015. godine kroz Operativni program promet ugovorila provedbu potpune implementacije riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi. Projektom je nabavljena oprema za implementaciju RIS-a na rijeci Savi. Projekt je završen u studenom 2016. Završetkom projekta uslugama riječnih informacijskih servisa pokriveno je ukupno 542,8 km vodnih putova.

Ukupna vrijednost projekta

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - Sredstva Republike Hrvatske | 754.593,75 kn – 15,00 % |
| - Sredstva EU fondova : | 4.276.031,25 kn – 85,00 % |
-

Ukupno zajedničko financiranje: 5.030.625,00 kn –100,00 %
Sredstva Republike Hrvatske za nepredviđene troškove i troškove nadzora 670.418,00 kn

Sveukupno: 5.701.043,00 kn

U 2016. godini od planiranih 2.062.200,00 kuna, realizirano je 1.993.039,37 kuna ili 96,65% čime je program okončan sa studenim 2016. godine

C. IZVJEŠĆE O SURADNJI S TIJELIMA NADLEŽNIM UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA DRUGIH DRŽAVA

1. Sastanci s nadležnim tijelima susjednih država

- s Mađarskom

Održan je redovni godišnji sastanak ovlaštenih stručnih organizacija Republike Hrvatske i Mađarske za obilježavanje vodnog puta na rijeci Dravi na dionici od zajedničkog interesa na kojem su usvojena izvješća o aktivnostima obilježavanja u 2015. godini i prihvaćeni planovi obilježavanja za 2016. godinu. Sastanak je održan u Pečuhu 31. 03. 2015. godine. Nakon toga, dana 02.06.2016. obavljen je zajednički obilazak dionice Drave od ušća do Osijeka u organizaciji hrvatske strane brodom „Vučedolska golubica“.

- s Bosnom i Hercegovinom

Tijekom 2016. nije održan nijedan sastanak, niti Međudržavne komisije niti mješovitih potkomisija za održavanje i obilježavanje plovnog puta rijeke Save (na dionici od zajedničkog interesa).

Prema zaključku sa zajedničkog sastanka u organizaciji Savske komisije, s nadležnim tijelima za obilježavanje obje zemlje obavljen je zajednički obilazak graničnog dijela vodnog puta Save od Davora do Račinovaca. U obilasku su sudjelovali:

- Predstavnici pravnih osoba koje obavljaju obilježavanje, Agencija za vodne putove u Republici Hrvatskoj i Geoprojekt SM iz Sremske Mitrovice u BiH.
- Nadzornici plovnog puta iz Republike Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine
- Lučki kapetani nadležnih kapetanija.

Cilj obilaska je bio međusobna razmjena iskustava i ujednačavanje načina obilježavanja, posebno postavljanja plovnih oznaka te ažuriranje planova obilježavanja.

Obilazak je obavljen u organizaciji hrvatske strane u tri radna dana:

- dana 03.07.2016 od Davora do Slavenskog Broda
- dana 02.11.2016 od Slav. Broda do Županje
- dana 03.11.2016. od Županje do Račinovaca (granice s Republikom Srbijom)

- s Republikom Srbijom

Tijekom 2016. održan je zajednički sastanak mješovitih stručnih grupa za obilježavanje i za održavanje plovnog puta na Dunavu. Sastanak je održan dana 25. 10.2016. u Beogradu u prostoru Direkcije za plovne puteve – Plovput Beograd.

Stručne službe Agencije za vodne putove i Direkcije za plovne puteve kontinuirano surađuju radi realiziranja planova obilježavanja koji se međusobno usklađuju, a realizira se i zajedničko hidrografsko snimanje na Dunavu koje je 2016. godine na kritičnim dionicama obavljala hrvatska strana.

Također je obavljena kontrola plovnog puta Dunava i obilježenosti od strane Agencije, Direkcije za plovne puteve i nadležnih tijela sigurnosti plovidbe obje države u zajedničkom obilasku koje je obavljeno brodom „Vučedolska golubica“ od Batine do

Iloka.

2. Sudjelovanje u radu tijela vezanih uz mrežu europskih plovnih putova

Predstavnici Agencije tijekom 2016.godine sudjelovali su aktivno u više važnih konferencija vezanih uz mrežu europskih plovnih putova kao što su:

- EUSDR (Strategija EU za Podunavsku regiju), Agencija sudjeluje u prioritetnoj osi A1 – mobilnost i vodni putovi kao tijelo imenovano od strane Republike Hrvatske za provođenje zaključaka i strateških ciljeva usuglašenih kroz ovu prioritetnu os. U svibnju 2016.g. u Zagrebu održan je sedmi sastanak upravljačke grupe prioritetnog područja 1A strategije EU za dunavsku regiju te je studenom u Beču održan deveti sastanak radne grupe.
- U sklopu rada Dunavske komisije, međunarodne organizacije čiji rad je poduprt od strane Vlada podunavskih zemalja, sa sjedištem u Budimpešti, Hrvatska ima svojeg predstavnika (djelatnika Agencije) u potkomisiji za tehnička pitanja plovidbe i vodnih putova. U 2016 godini održane su dvije sjednice navedene potkomisije.
- U sklopu rada Savske komisije predstavnici Agencije su sudjelovali na sastanku Radne grupe za plovidbu, redovnom sastanku s kapetanima Lučkih kapetanija na Savi te na sastanku s predstavnicima Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine o mogućnostima izrade projekta za uređenje najkritičnije dionice za plovidbu vodnog puta rijeke Save
- Predstavnici Agencije sudjeluju aktivno i u radu. tri najvažnije podunavske komisije – ICPDR (Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav), Dunavske komisije i Savske komisije koja se jednom godišnje sastaje u jednom od tri sjedišta ovih komisija (Beč, Budimpešta, Zagreb), a 2016.održano je zasjedanje u Budimpešti.
- Tijekom 2015. godine Agencija je dobila poziv da se pridruži INE (Inland navigation Europe), jedinstvenoj platformi nacionalnih i regionalnih administracija vodnih putova, poduprtoj od strane EK.. U svibnju 2016. Agencija je primljena u ovu organizaciju..
- Predstavnik Agencije sudjeluje redovito na sastancima dionika TENT – T Rajnsko – dunavskog koridora (najmanje 2 puta godišnje u Bruxellesu) te što je osobito važno, ima predstavnika i u radnoj grupi za vodne putove navedenog koridora čime je u prilici direktno utjecati na strategiju razvoja vodnih putova na koridoru, što i otvara mogućnosti za financiranje budućih infrastrukturnih projekata iz europskih fondova (npr. plovni put r. Save, kanal Dunav-Sava itd.)
- Tijekom 2016.g. Agencija je zajedno sa još 8 sličnih administracija vodnih putova iz podunavskih zemalja aplicirala projekt Danube STREAM (nastavak projekta NEWADA duo) na program transnacionalne suradnje interreg DUNAV 2014-2020. Komponentra Agencije bit će financirana sa 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iznositi će oko 140.000 EUR u periodu 2017-2019. Cilj projekta je suradnja vodnih administracija razmjenom znanja stručnjaka na području hidrologije i hidrografije, poboljšanje pristupa ICT mreži, poboljšanje fizičke dostupnosti infrastrukture plovnih putova svih zemalja uključenih u projekt.

- Premda je projekt NEWADA Duo koji je imao cilj umrežiti administracije vodnih putova u podunavskim zemljama završio u 2014.g., kao jedan od rezultata i naslijeđa tog vrlo uspješnog projekta jest osnivanje Board of Directors (Vijeća direktora) administracija koja se jednom godišnje sastaje kako bi raspravila tekuću problematiku. Tijekom 2016. sastanak je održan u svibnju u Zagrebu.

ZAKLJUČAK

Agencija za vodne putove je, sukladno financijskim mogućnostima, izvršila veći dio predviđenih aktivnosti predviđenih za 2016. godinu.

U provođenju Programa radova uređenja i tehničkog održavanja postojale su poteškoće u realizaciji koje se mogu sažeti u sljedećem:

- Godišnji program radova je radi ograničenja u radu Upravnog vijeća donesen tek u srpnju 2016. kada se moglo pristupiti postupcima javne nabave za radove, a u postupcima javne nabave česti su žalbeni postupci koji ne garantiraju pravovremeni početak, a time ni dovršetak radova i nabave u tekućoj godini (ugovaranje Studije opravdanosti za VKDS i ugovaranje broda za obilježavanje na Dunavu iz projekta Dunav FAIRway Hrvatska).
- Problem je što su radovi na vodotocima uvjetovani vodostajem, tako da uvijek postoji određena vjerojatnost da vodostaji u tijeku ugovornog razdoblja budu nepovoljni za obavljanje hidrotehničkih radova.
- Radovi tehničkog održavanja su, prema mjerama zaštite prirode, pripisanim Rješenjima o glavnoj ocjeni vremenski ograničeni na razdoblje od kolovoza do ožujka kada prevladavaju niski vodostaji i zimsko razdoblje.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 1.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016.**

Prihodi:				
Konto	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	ostvareno/planirano
632	Pomoći od međ.org.te instit. i tijela EU	2.914.681	2.209.863	0,0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	912.718	1.703.332	0
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	2.001.963	506.531	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	6.206	0,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	6.206	0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	5.381	0	0,0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.381	0	0
671	Prihodi iz proračuna	15.928.645	11.779.487	79,5
6711	Prihod za fin rashoda poslovanja	10.705.481	10.416.970	87,9
6712	Prihod za nabavu nefin imovine	5.223.164	1.362.517	45,8
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0,0
683	Ostali prihodi	290	1.068	0,0
Ukupno prihodi:		18.848.997	13.996.624	76,5

Rashodi

Rashodi poslovanja:

Konto	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ostvareno/planirano
311	Plaće	2.642.701	2.652.168	97,0
3111	Plaće za redovan rad	2.642.701	2.652.168	97,2
3113	plaće za prekovremeni rad	0	0	0,0
3114	plaće za posebne uvjete rada	0	0	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.497	120.940	97,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.497	120.940	97,5
313	Doprinosi na plaće	454.766	456.173	91,9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	409.619	411.086	93,9
3133	Doprinosi za obvezno osig u slučaju nezaposle	45.147	45.087	76,9
321	Naknade troškova zaposlenima	634.482	680.244	88,2
3211	Službena putovanja	162.167	225.268	80,0
3212	Naknade za prijevoz,rad na terenu,...	418.494	412.772	97,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.087	40.590	67,7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	734	1.614	32,3
322	Rrashodi za materijal i energiju	789.002	614.506	83,0
3221	Uredski materijal i ostali mat rashodi	47.511	43.860	87,7
3222	Materijal i sirovine	0	0	0,0
3223	Energija	561.540	438.933	84,4
3224	Materijal i dijelovi za tek i invest održavanje	82.627	64.714	76,1
3225	Sitni inventar i auto gume	67.343	37.764	75,5
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	29.981	29.235	97,5

323	Rashodi za usluge	6.658.784	7.046.691	83,9
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	165.877	157.321	73,1
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	4.368.259	3.965.725	84,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.778	60.788	95,7
3234	Komunalne usluge	10.737	13.505	90,0
3235	Zakupnine i najamnine	417.567	512.919	73,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.722	1.272	12,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	438.375	588.746	85,4
3238	Računalne usluge	1.096.232	1.631.375	85,5
3239	Ostale usluge	105.237	115.040	102,7
324	Naknade troškova osob.izvan radnog odnos	18.508	6.266	34,8
3241	Naknade troškova osob.izvan radnog odnosa	18.508	6.266	34,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.356	547.284	93,5
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	336.065	374.216	99,8
3292	Premije osiguranja	59.769	84.863	94,3
3293	Reprezentacija	28.769	29.743	47,2
3294	Članarine i norme	0	19.998	100,0
3295	Pristojbe i naknade	4.029	15.388	153,9
3296	Troškovi sudskih postupka	0	0	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.724	23.076	102,6
343	Ostali finansijski rashodi	443	37	0,6
3431	Bankarske usluge i usl platnog prometa	0	0	0,0
3433	Zatezne kamate	443	24	2,4
3434	Ostali nespomenuti f inancijski rashodi	0	13	0,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0
3835	Ostale kazne	0	0	0,0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim f inancij.	0	0	0,0
3	Rashodi poslovanja:	11.665.528	12.124.309	87,3

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:				
Konto	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	ostvareno/ planirano
412	Nematerijalna imovina	1.382.346	765.875	39,7
4123	licence	33.211	0	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.349.135	765.875	40,3
421	Građevinski objekti	1.859.474	0	0,0
4212	Poslovni objekti	0	0	0,0
4214	Ostali građevinski objekti	1.859.474	0	0,0
422	Postrojenja i oprema	2.455.886	658.686	83,3
4221	Uredska oprema i namještaj	18.029	0	0,0
4222	Komunikacijska oprema	2.355.250	71.440	102,1
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	4.112	20,6
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	47.833	559.352	91,5
4227	Uređaji, strojevi i opre za ost namjene	34.774	23.782	47,6
423	Prijevozna sredstva	649.799	235.705	17,6
4233	Prijevozna sredstva u riječnom prom	649.799	235.705	17,6
426	ematerijalna proizvedena imovin	0	0	0,0
4262	Ulaganje u računalne programe	0	0	0,0
451	Dodatna ulaganja na građ objekt	597.012	210.280	70,1
4511	Dodatna ulaganja u građ objekte	597.012	210.280	70,1
454	Dod ulag za ost nefin imovinu	280.609	0	0,0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefin imovi	280.609	0	0,0
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine:	7.225.126	1.870.546	42,4
Ukupno rashodi:		18.890.665	13.994.855	76,5

	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	ostvareno/ planirano
UKUPNO PRIHODI	18.848.997	13.996.624	76,5
UKUPNO RASHODI	18.890.665	13.994.855	76,5
Višak prihoda		1.769	
Manjak prihoda prihoda	-41.668		
Višak prihoda preneseni	188.089	146.421	
Manjak prihoda preneseni			
Višak prihoda i primitaka	146.421	148.190	
Manjak prihoda i primitaka			
Rashodi budućih razdoblja			
Rezultat	146.421	148.190	

Ravnatelj:
Zrinko Zvocak, dipl.oec.
